Planning DCE
Aménagement d'une Médiathèque et d'un Pôle Tertiaire à PONTGIBAUD

N°	Texte1	Nom de la tâche
1		**Réunion de préparation**
2	**Lot 02**	**Commande de la charpente**
3	**Lot 07**	**Prise de cotes et commande menuiseries ext**
4	**Lot 01**	**Démolition - Gros Œuvre - Réseaux**
5		Instalation de chantier
6		Démolition Ext et int
7		Arases charpente
8		Travaux structure ext
9	**Lot 02**	**CHARPENTE BOIS COUVERTURE ZINGUERIE**
10		Détuilage et dépose charpente
11		Pose de la Charpente
12		Couverture Zingerie
13	**Lot 03**	**CHARPENTE METALLIQUE SERRURERIE ETANCHEITE**
14		Pose de la Charpente Metallique
15		Etancheité
16		Pose du bardage
17		Pose de l'escalier ext
18	**Lot 04**	**Menuiseries Extérieures**
19		Depose des menuiseries existante
20		Pose des menuiseries bois
21	**Lot 05**	**Platrerie Finition**
22		Platrerie
23		Peinture
24	**Lot 06**	**Isolation des combles**
25	**Lot 07**	**Menuiseries Intérieures**
26		Fourniture des huisseries
27		Pose des plinthes et tablettes bois
28		Rampe / Claustras ect….
29	**Lot 08**	**Faience - Revetement Ext**
30	**Lot 09**	**Sols souples**
31		Ragréage
32		Pose du sol
33	**Lot 10**	**PSCV**
34		Reseaux
35		Plancher chauffant
36		Remontage
37	**Lot 11**	**Courant fort / Faible**
38		Reseaux
39		Remontage
40	**Lot 12**	**Chape anhydride**
41	**Lot 13**	**Signalitiques Parkings et jeux**
42	**Lot 14**	**Elévateur PMR**
43		Instalation Elévateur
44		Mise en route Elévateur
45	**Lot 15**	**Voirie**
46		Decoupe voirie existante et terrassement
47		Reprise enrobé / création parking etc…..
48		
49		**OPR**
50		**RECEPTION**

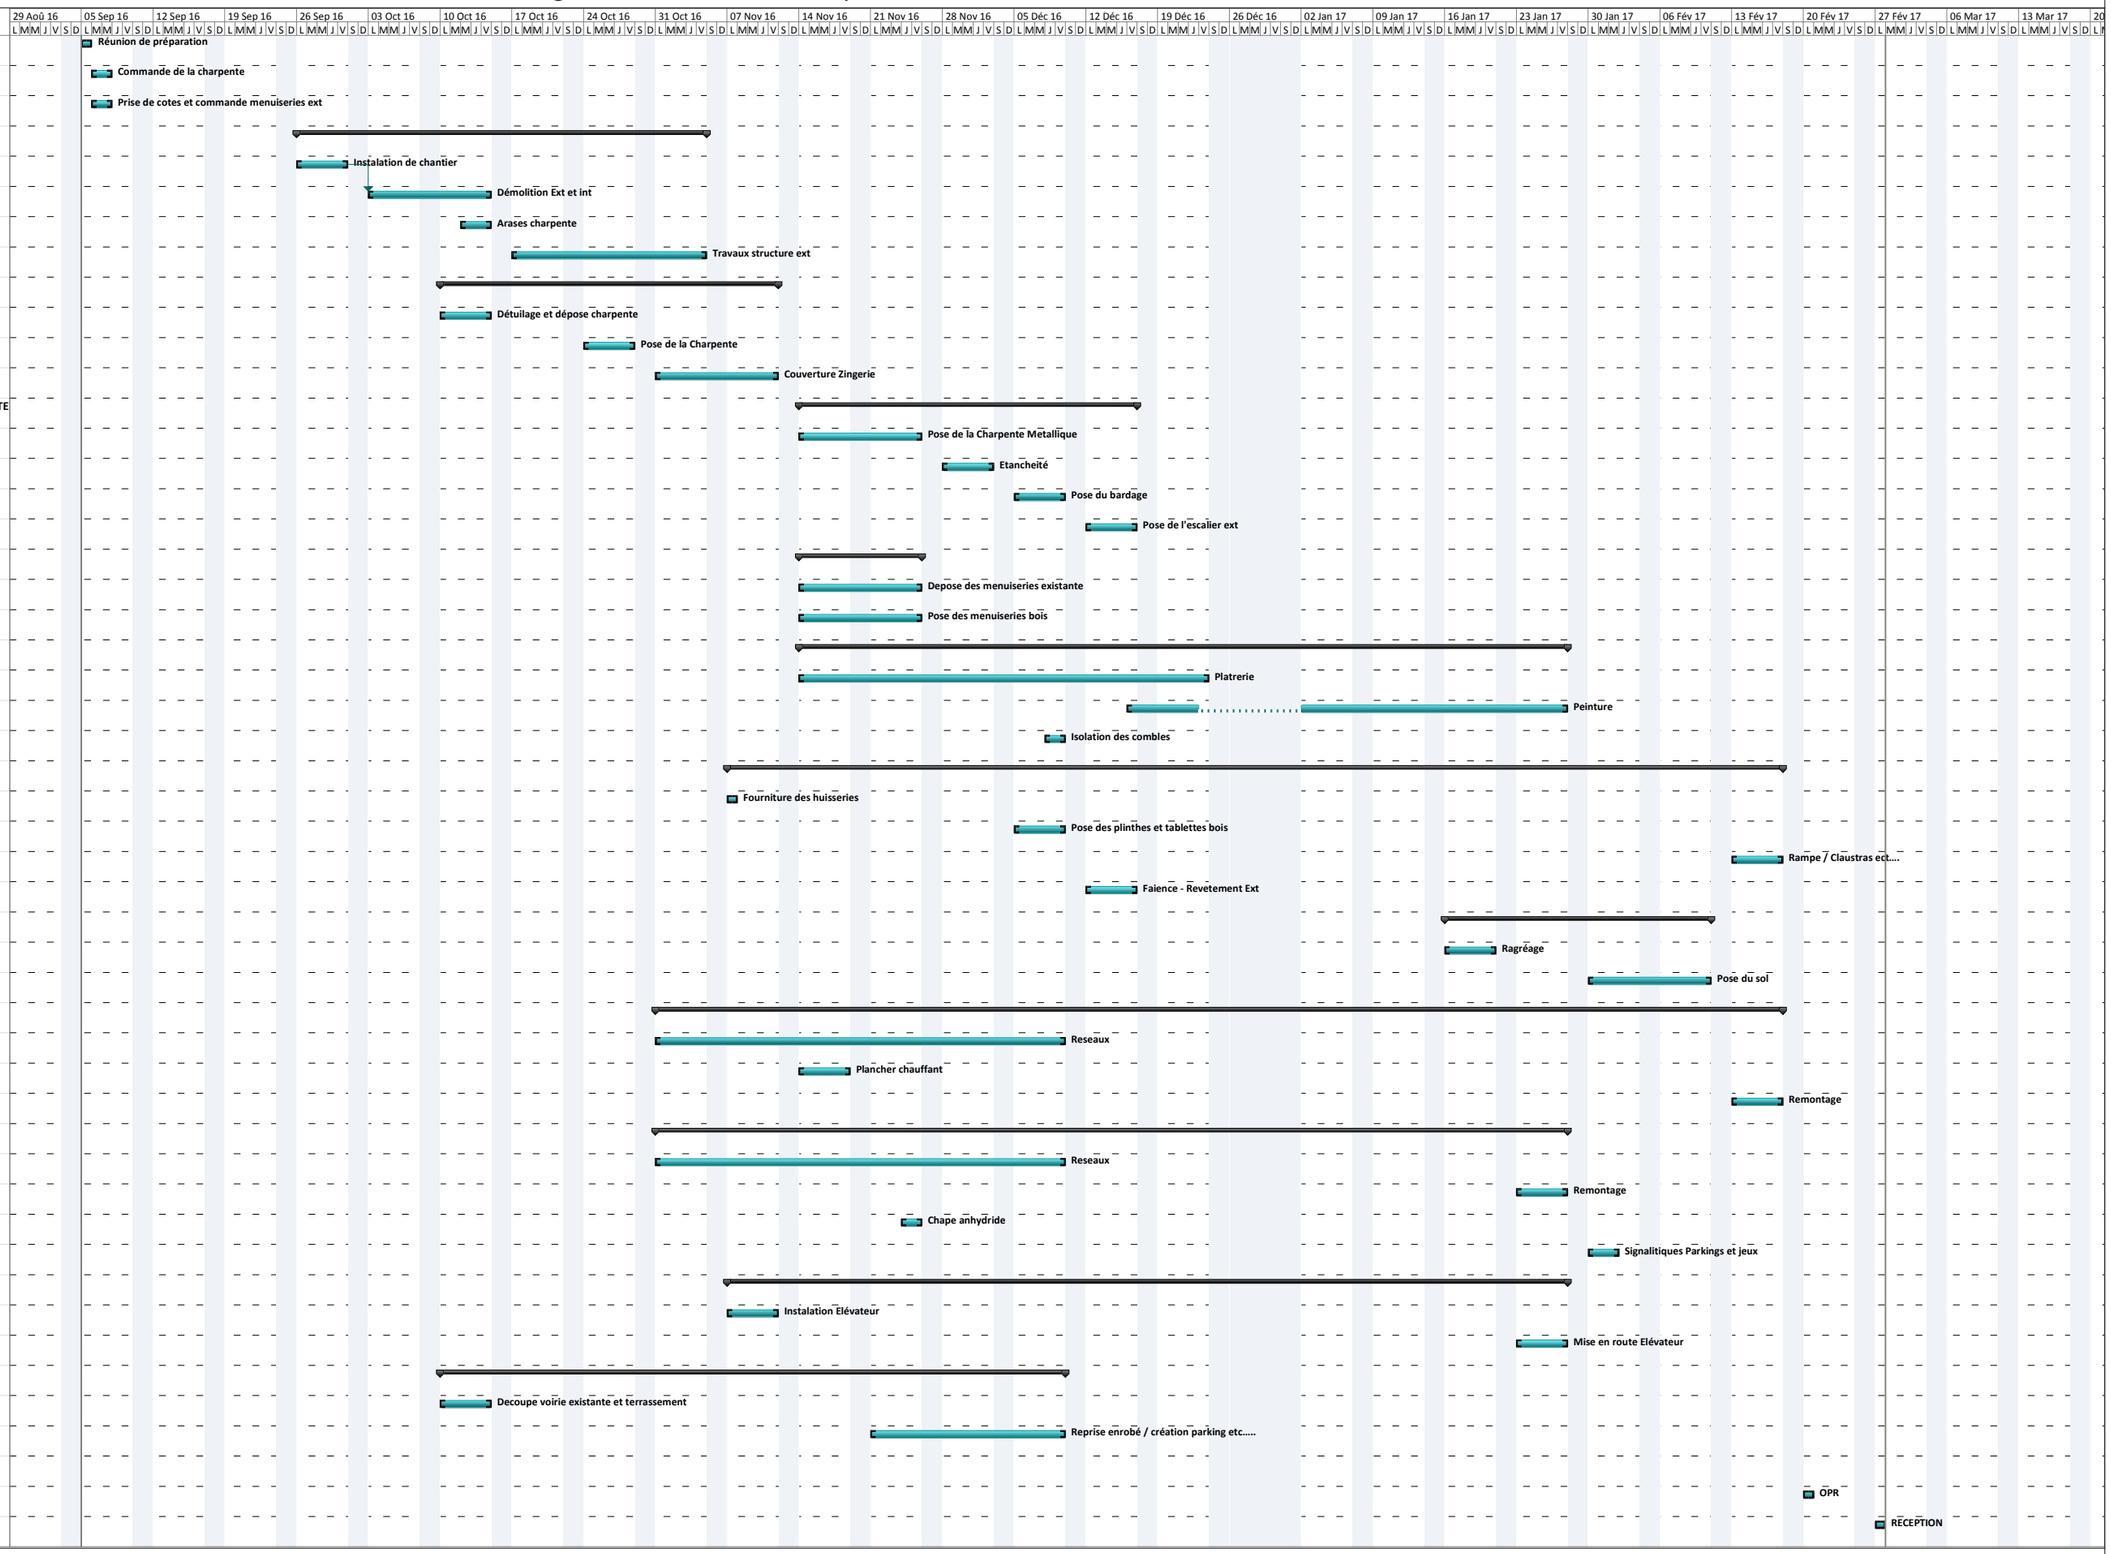

Etablie le: 30/05/2016
Mise à jour le: 08/08/2016
